




○公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況について、2020年3月末時点の進捗状況を取りまとめました。  
○浦安市における公共インフラの復旧・復興は完了しています。  
今後は、地籍調査(予備調査)を通じて、土地の境界確定を推進するなど、市として新たなステージに入りました。

指標について


- ・ **着工** か **完了** かを分かりやすく記載。
- ・ 今後、指標は節目節目において更新するとともに、事業の進捗に応じて **着工** から **完了** を示す指標への切り替え、指標の追加など、進捗状況を適切に示す工夫を実施。

■指標の例


| 項目<br>〔指標名〕                         | 進捗率                                                                                           | 復旧・復興の状況／被害の状況                        | 備考 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| <b>着工</b><br>○○○○<br>本格復旧に着工した○○の割合 |  <b>88%</b>  | 本復旧工事に着工した箇所数 88 箇所<br>被災した箇所数 100 箇所 |    |
| <b>完了</b><br>□□□□<br>本格復旧が完了した□□の割合 |  <b>47%</b> | 本復旧が完了した箇所数 47 箇所<br>被災した箇所数 100 箇所   |    |


| 項目<br>〔指標名〕                                                  | 進捗率                                                                                             | 復旧・復興の状況／被害の状況                                                          | 備考                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>完了</b><br><b>道路</b><br>本復旧工事及び液状化対策工事に<br>着工及び完了した道路工事の割合 |  <b>100%</b> | 本復旧が完了した街区内道路L=83.2km<br>幹線道路液状化対策工事L=8.7km<br>災害査定で採択された道路被害延長L=64.1km | 幹線道路の災害復旧工事・液<br>状化対策工事はH29.3完了。街<br>区内道路の災害復旧工事は<br>R2.3完了。 |

液状化対策(幹線道路)のイメージ

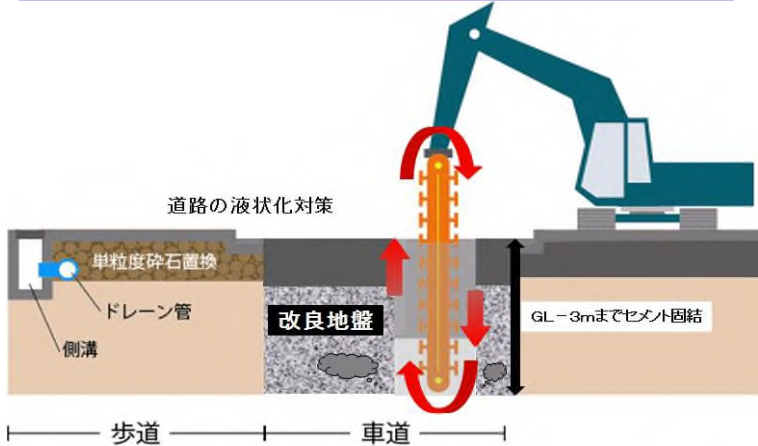


街区内道路災害復旧工事のイメージ

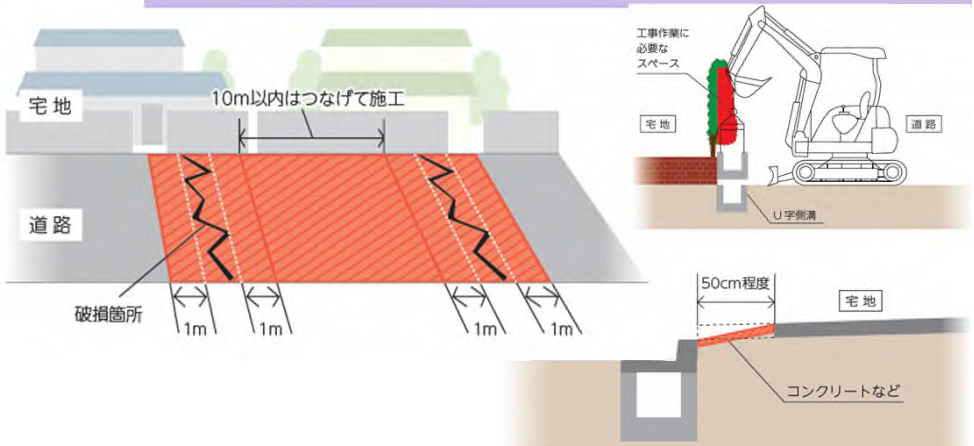



|                                                   |                                                                                                 |                                                                                  |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>完了</b><br><b>下水道</b><br>本復旧工事が完了した<br>下水道工事の割合 |  <b>100%</b> | 本復旧が完了した下水道管きょ延長<br>29.4km、マンホール898基<br>災害査定で採択された下水道管きょ延長<br>L=23.2km、マンホール700基 | <b>H28.2完了</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

下水道(開削工法)のイメージ

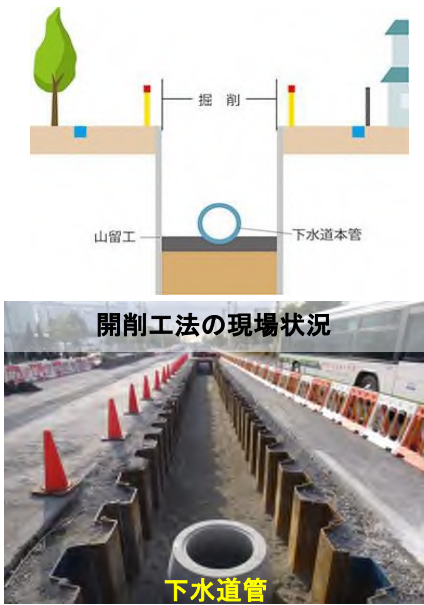


下水道(推進工法)のイメージ

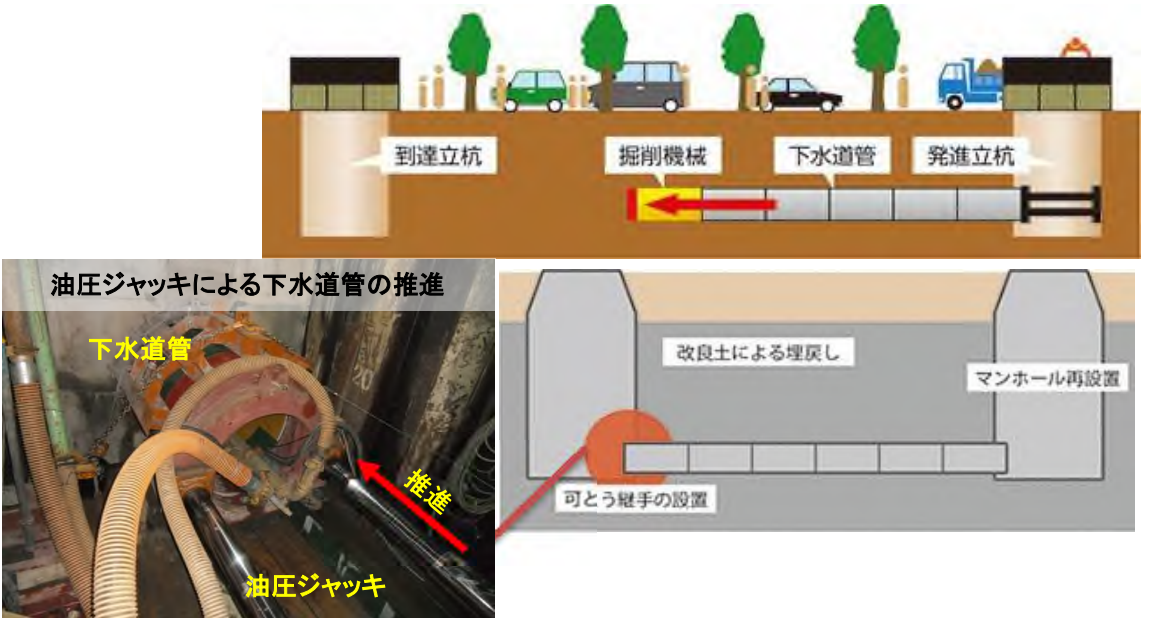

| 項目<br>〔指標名〕                                                       | 進捗率                                                                                             | 復旧・復興の状況／被害の状況                                         | 備考             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>完了</b><br><b>雨水排水施設</b><br>本復旧工事及び貯留施設設置工事が<br>完了した雨水排水施設工事の割合 |  <b>100%</b> | 本復旧が完了した雨水管きょ内土砂撤去22.7km<br>災害査定で採択された雨水管きょ内土砂撤去22.7km | <b>H28.7完了</b> |

|    |                                    |                 |                                                                                  |                                       |
|----|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 完了 | <b>水道</b><br>本復旧工事が完了した<br>水道工事の割合 | <br>0% 50% 100% | 100%<br>災害復旧工事のうち本復旧工事が完了した水道管延長13.4km<br>災害査定で採択された水道管の延長13.4km(災害復旧工事、一部県道を含む) | <b>H27.3完了</b><br>※水道管耐震化整備工事は引き続き実施中 |
| 完了 | <b>ガス</b><br>完了したガス工事の割合           | <br>0% 50% 100% | 100%<br>工事が完了したガス管延長48.9km<br>ガス管入替え計画延長48.9km                                   | <b>H28.2完了</b><br>※ガス管耐震化整備工事は引き続き実施中 |
| 完了 | <b>東京電力</b><br>本復旧工事が完了した<br>電柱の割合 | <br>0% 50% 100% | 100%<br>本復旧が完了した電柱の数642本<br>被災した電柱の数642本                                         | <b>H28.3完了</b>                        |
| 完了 | <b>NTT</b><br>本復旧工事が完了した<br>電信柱の割合 | <br>0% 50% 100% | 100%<br>本復旧が完了した電信柱の数312本<br>被災した電信柱の数312本                                       | <b>H26.6完了</b>                        |
| 完了 | <b>市街地液状化対策事業</b>                  | <br>0% 50% 100% | <b>【工事箇所】</b><br>東野三丁目地区の一部(33宅地)                                                | <b>R1.8完了</b>                         |

### 市街地液状化対策事業のイメージ

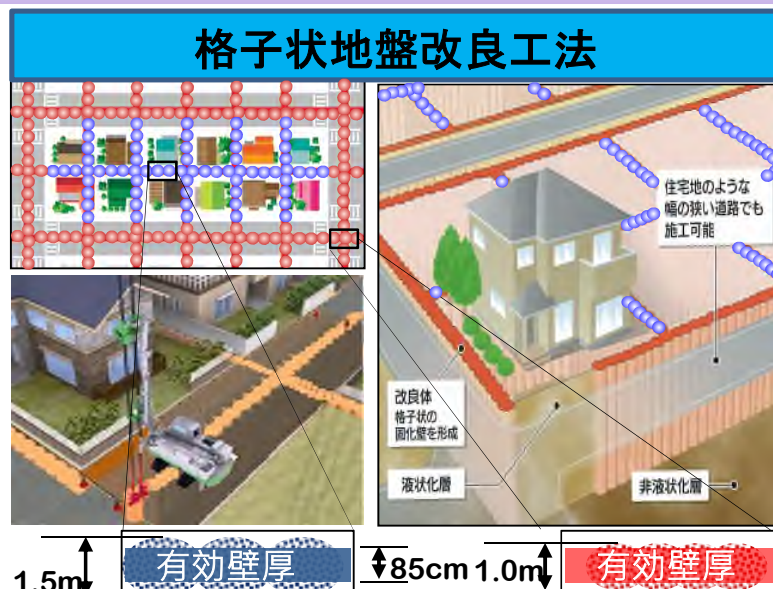


● 道路部分  
● 宅地部分



|    |                                   |                 |                                                                                                                           |                                 |
|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 着工 | <b>地籍調査</b><br>地籍調査に着手した<br>面積の割合 | <br>0% 50% 100% | 79%<br>地籍調査で着手している土地面積7.81km <sup>2</sup> (予備調査地区含む)<br>地震によって移動した境界の調査・確認が必要な面積9.85km <sup>2</sup> (元町及び港、高洲・舞浜の一部地区を除く) | 大規模街区:平成29年度完了<br>戸建地区:予備調査⇒本調査 |
|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

### 地籍調査のイメージ



**予備調査(境界確認作業)**  
境界復元案を提示し、地権者の同意を得る

**地籍調査(国土調査法に基づく調査)**  
境界確認作業などを行い、最終的に登記に反映する

※境界確定のために行う予備調査および地籍調査については、土地の所有者である住民の皆さんの金銭的な負担はありません



地権者の同意

